TERMINPLAN BETRIEBSANLAGE ABM
nach LV-Gruppen

Nr.	LV	OSP	Vorgangsname	D	Anfang
	HG02		**BAU**	**131t**	**07.05.14**
136	HG02	1	A_NL Mängelbehebung	10 t	30.10.14
140	HG02	1	MS Übernahme/Übergabe	0 t	12.11.14
	HG02.OG01		**AUSSENANLAGEN**	**105t**	**12.05.14**
	HG02.OG01.02		**Abbruch**	**16t**	**12.05.14**
77	HG02.OG01.02	1.4	A_HS Z Decke abbrechen	3 t	12.05.14
79	HG02.OG01.02	1.4	A_HS Z Schachtabdeckungen - Einstiege herstellen	3 t	02.06.14
	HG02.OG01.06		**Aufschließung,Infrastruktur**	**90t**	**12.05.14**
128	HG02.OG01.06	1.6	A_HS AA Umbau Bestandskanal	15 t	12.05.14
129	HG02.OG01.06	1.6	A_HS AA Fernwärmeleitung Blaulichtzentrale	10 t	28.07.14
133	HG02.OG01.06	1.6	A_HS AA Asphaltierung	5 t	15.09.14
	HG02.OG01.07		**Beton u.Stahlbetonarbeiten**	**97t**	**22.05.14**
78	HG02.OG01.07	1.4	A_HS Z Fertigteildecke neu herstellen	5 t	22.05.14
130	HG02.OG01.07	1.6	A_HS AA Einfriedung	10 t	29.09.14
	HG02.OG01.31		**Metallbauarbeiten (Schlosser)**	**3t**	**18.08.14**
131	HG02.OG01.31	1.6	A_HS AA Montage Schiebetor	3 t	18.08.14
	HG02.OG02		**NEUBAU SALZHALLE UND HEIZHAUS**	**94t**	**07.05.14**
75	HG02.OG02	1.2	A_HS LH Restleistungen/Mängelbehebung	10 t	09.09.14
	HG02.OG02.03		**Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen**	**38t**	**12.05.14**
34	HG02.OG02.03	1.2	A_VB BT4 Abbruch Dachdeckung Welleternit	4 t	12.05.14
35	HG02.OG02.03	1.2	A_VB BT4 Salzhalle abbrechen	6 t	16.05.14
44	HG02.OG02.03	1.1	A_HS HH Erdarbeiten durchführen	4 t	26.05.14
61	HG02.OG02.03	1.2	A_HS LH Erdarbeiten durchführen	5 t	02.07.14
	HG02.OG02.06		**Aufschließung,Infrastruktur**	**52t**	**07.05.14**
32	HG02.OG02.06	1.2	A_VB BT4 Spannungsfreischaltung durchführen	1 t	07.05.14
102	HG02.OG02.06	1.3	A_HS VW Kanal Bodenleitung	5 t	17.07.14
	HG02.OG02.07		**Beton u.Stahlbetonarbeiten**	**51t**	**04.06.14**
45	HG02.OG02.07	1.1	A_HS HH Bodenplatte Heizhaus mit Vertiefung herstellen	6 t	04.06.14
46	HG02.OG02.07	1.1	A_HS HH Wände Heizhaus herstellen	5 t	12.06.14
47	HG02.OG02.07	1.1	A_HS HH Fertigteildecke Heizhaus verlegen	5 t	25.06.14
62	HG02.OG02.07	1.2	A_HS LH Bodenplatte herstellen	10 t	09.07.14
63	HG02.OG02.07	1.2	A_HS LH Wände herstellen	8 t	23.07.14
64	HG02.OG02.07	1.2	A_HS LH Dach montieren	10 t	04.08.14
	HG02.OG02.22		**Dachdeckerarbeiten**	**3t**	**29.08.14**
68	HG02.OG02.22	1.2	A_HS LH Seilsicherung - Absturzsicherung	3 t	29.08.14
	HG02.OG02.31		**Metallbauarbeiten (Schlosser)**	**31t**	**23.06.14**
50	HG02.OG02.31	1.1	A_HS HH Montage Stahlstiege	1 t	23.06.14
72	HG02.OG02.31	1.2	A_HS LH Umbau Sektionaltor Salzhalle	3 t	31.07.14
	HG02.OG02.43		**Türsysteme**	**3t**	**21.07.14**
51	HG02.OG02.43	1.1	A_HS HH Montage Türen und Fenster	3 t	21.07.14
	HG02.OG02.44		**Wärmedämmverbundsysteme**	**5t**	**24.07.14**
52	HG02.OG02.44	1.1	A_HS HH Fassaden Vollwärmeschutz	5 t	24.07.14
	HG02.OG02.46		**Beschichtung auf Mauerwerk,Putz und Beton**	**3t**	**19.08.14**
70	HG02.OG02.46	1.2	A_HS LH Spenglerarbeiten	3 t	19.08.14
	HG02.OG02.65		**Toranlagen in Gebäuden**	**81t**	**08.05.14**
33	HG02.OG02.65	1.2	A_VB BT4 Tor demontieren und seitlich lagern	1 t	08.05.14
69	HG02.OG02.65	1.2	A_HS LH Montage Bestandstor	2 t	03.09.14
	HG02.OG03		**NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE**	**97t**	**05.06.14**
	HG02.OG03.06		**Aufschließung,Infrastruktur**	**7t**	**05.06.14**
88	HG02.OG03.06	1.3	A_HS VW Einfahrt herstellen	5 t	05.06.14
87	HG02.OG03.06	1.3	A_HS VW Erdarbeiten	6 t	06.06.14
	HG02.OG03.07		**Beton u.Stahlbetonarbeiten**	**21t**	**16.06.14**
89	HG02.OG03.07	1.3	A_HS VW Bodenplatte mit Erdung	8 t	16.06.14
92	HG02.OG03.07	1.3	A_HS VW Fertigteildecke mit E-Verrohrung	5 t	10.07.14
	HG02.OG03.11		**Estrich**	**37t**	**11.08.14**
105	HG02.OG03.11	1.3	A_HS VW Fußbodenaufbau - Estrich	7 t	11.08.14
106	HG02.OG03.11	1.3	A_HS VW Estrich nicht begehbar	5 t	21.08.14
107	HG02.OG03.11	1.3	A_HS VW Estrich Trockenzeit ohne Heizen	15 t	21.08.14
108	HG02.OG03.11	1.3	A_HS VW Estrich Trockenzeit ausheizen	15 t	11.09.14
	HG02.OG03.12		**Abdichtungen bei Betonflächen und Wänden**	**13t**	**17.07.14**
93	HG02.OG03.12	1.3	A_HS VW Notabdichtung Decke	3 t	17.07.14
90	HG02.OG03.12	1.3	A_HS VW Abdichtung Bodenplatte	3 t	31.07.14
	HG02.OG03.22		**Dachdeckerarbeiten**	**10t**	**17.07.14**
95	HG02.OG03.22	1.3	A_HS VW Dachaufbau	10 t	17.07.14
	HG02.OG03.24		**Fliesen- und Plattenlegearbeiten**	**23t**	**15.09.14**
112	HG02.OG03.24	1.3	A_HS VW Fliesenlegerarbeiten Wand	10 t	15.09.14
113	HG02.OG03.24	1.3	A_HS VW Fliesenlegerarbeiten Boden	10 t	02.10.14
	HG02.OG03.31		**Metallbauarbeiten (Schlosser)**	**4t**	**05.08.14**
97	HG02.OG03.31	1.3	A_HS VW Vordächer	4 t	05.08.14
	HG02.OG03.39		**Trockenbauarbeiten**	**54t**	**30.06.14**
91	HG02.OG03.39	1.3	A_HS VW Doppelwände mit E-Verrohrung	8 t	30.06.14
109	HG02.OG03.39	1.3	A_HS VW Gipskartonwände mit Zargen	8 t	28.08.14
111	HG02.OG03.39	1.3	A_HS VW abgehängte Decke	4 t	09.09.14
	HG02.OG03.43		**Türsysteme**	**3t**	**20.10.14**
118	HG02.OG03.43	1.3	A_HS VW Innentüren	3 t	20.10.14
	HG02.OG03.44		**Wärmedämmverbundsysteme**	**20t**	**05.08.14**
99	HG02.OG03.44	1.3	A_HS VW Vollwärmeschutzfassade	20 t	05.08.14
	HG02.OG03.46		**Beschichtung auf Mauerwerk,Putz und Beton**	**41t**	**07.08.14**
101	HG02.OG03.46	1.3	A_HS VW Spachtelung Stahlbetonwände	4 t	07.08.14
114	HG02.OG03.46	1.3	A_HS VW Malerarbeiten und Spachtelarbeiten	10 t	22.09.14
	HG02.OG03.50		**Klebearbeiten für Boden- und Wandbeläge**	**10t**	**06.10.14**
117	HG02.OG03.50	1.3	A_HS VW Laminatboden	10 t	06.10.14
	HG02.OG03.53		**Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff**	**3t**	**17.07.14**
98	HG02.OG03.53	1.3	A_HS VW Montage Fenster Aussentüren	3 t	17.07.14
	HG02.OG04		**NEUBAU ABFALLWIRTSCHAFT**	**21t**	**16.06.14**
	HG02.OG04.03		**Roden, Baugrube, Sicherungen u.Tiefgründungen**	**3t**	**16.06.14**
121	HG02.OG04.03	1.5	A_HS OA Erdarbeiten	3 t	16.06.14
	HG02.OG04.07		**Beton u.Stahlbetonarbeiten**	**10t**	**23.06.14**
122	HG02.OG04.07	1.5	A_HS OA Bodenplatte mit Erdung	5 t	23.06.14
123	HG02.OG04.07	1.5	A_HS OA Stahlbetonwände	5 t	30.06.14
	HG02.OG04.22		**Dachdeckerarbeiten**	**3t**	**14.07.14**
125	HG02.OG04.22	1.5	A_HS OA Dachkonstruktion	3 t	14.07.14
	HG02.OG04.32		**Konstruktiver Stahlbau**	**4t**	**07.07.14**
124	HG02.OG04.32	1.5	A_HS OA Stahlbau	4 t	07.07.14
	HG03		**HEIZUNGS-,LÜFTNGS- UND SANITÄRINSTALLATIONEN**	**110t**	**02.05.14**
48	HG03	1.1	A_HS HH Lieferung, Montage Pufferspeicher 15.000ltr	2 t	23.06.14
	HG03.OG01		**Abbruch und Demontagen**	**79t**	**02.05.14**
20	HG03.OG01	1.1	A_PL HH Planfreigabe Heizkessel	1 t	02.05.14
21	HG03.OG01	1.1	A_PP HH Fertigung, Produktion Heizkessel	45 t	06.05.14
54	HG03.OG01	1.1	A_HS HH Zuleitung Rohrtrasse verlegen	6 t	12.06.14
55	HG03.OG01	1.1	A_HS HH Lieferung, Montage Heizkessel	5 t	14.07.14
57	HG03.OG01	1.1	A_HS HH Installation Heiztechnik	10 t	21.07.14
58	HG03.OG01	1.1	A_HS HH Inbetriebnahme Heizung	5 t	13.08.14
66	HG03.OG01	1.2	A_HS LH Montage Sonnenkollektoren	3 t	19.08.14
67	HG03.OG01	1.2	A_HS LH Verrohrung Sonnenkollektoren	5 t	22.08.14
	HG03.OG03		**Neubau Verwaltungsgebäude**	**51t**	**31.07.14**
104	HG03.OG03	1.3	A_HS VW HKLS Installation	50 t	31.07.14
116	HG03.OG03	1.3	A_HS VW Komplettierung Haustechnik	5 t	06.10.14
	HG04		**ELEKTROINSTALLATIONEN**	**59t**	**21.07.14**
126	HG04	1.5	A_HS OA E-Installation	2 t	21.07.14
56	HG04	1.1	A_HS HH Installation E-Technik	15 t	23.07.14
73	HG04	1.2	A_HS LH Installation E-Technik	10 t	04.08.14
74	HG04	1.2	A_HS LH Komplettierung E-Installation	15 t	19.08.14
71	HG04	1.2	A_HS LH Blitzschutzmontage	3 t	22.08.14
132	HG04	1.6	A_HS AA Beleuchtung	5 t	08.09.14
	HG04.OG03		**Neubau Verwaltungsgebäude**	**51t**	**31.07.14**
103	HG04.OG03	1.3	A_HS VW E-Installation im Fußboden	10 t	31.07.14
110	HG04.OG03	1.3	A_HS VW Installation E-Technik in Wänden	8 t	28.08.14
96	HG04.OG03	1.3	A_HS VW Blitzschutzanlage	10 t	03.09.14
115	HG04.OG03	1.3	A_HS VW Komplettierung E-Installation	5 t	06.10.14

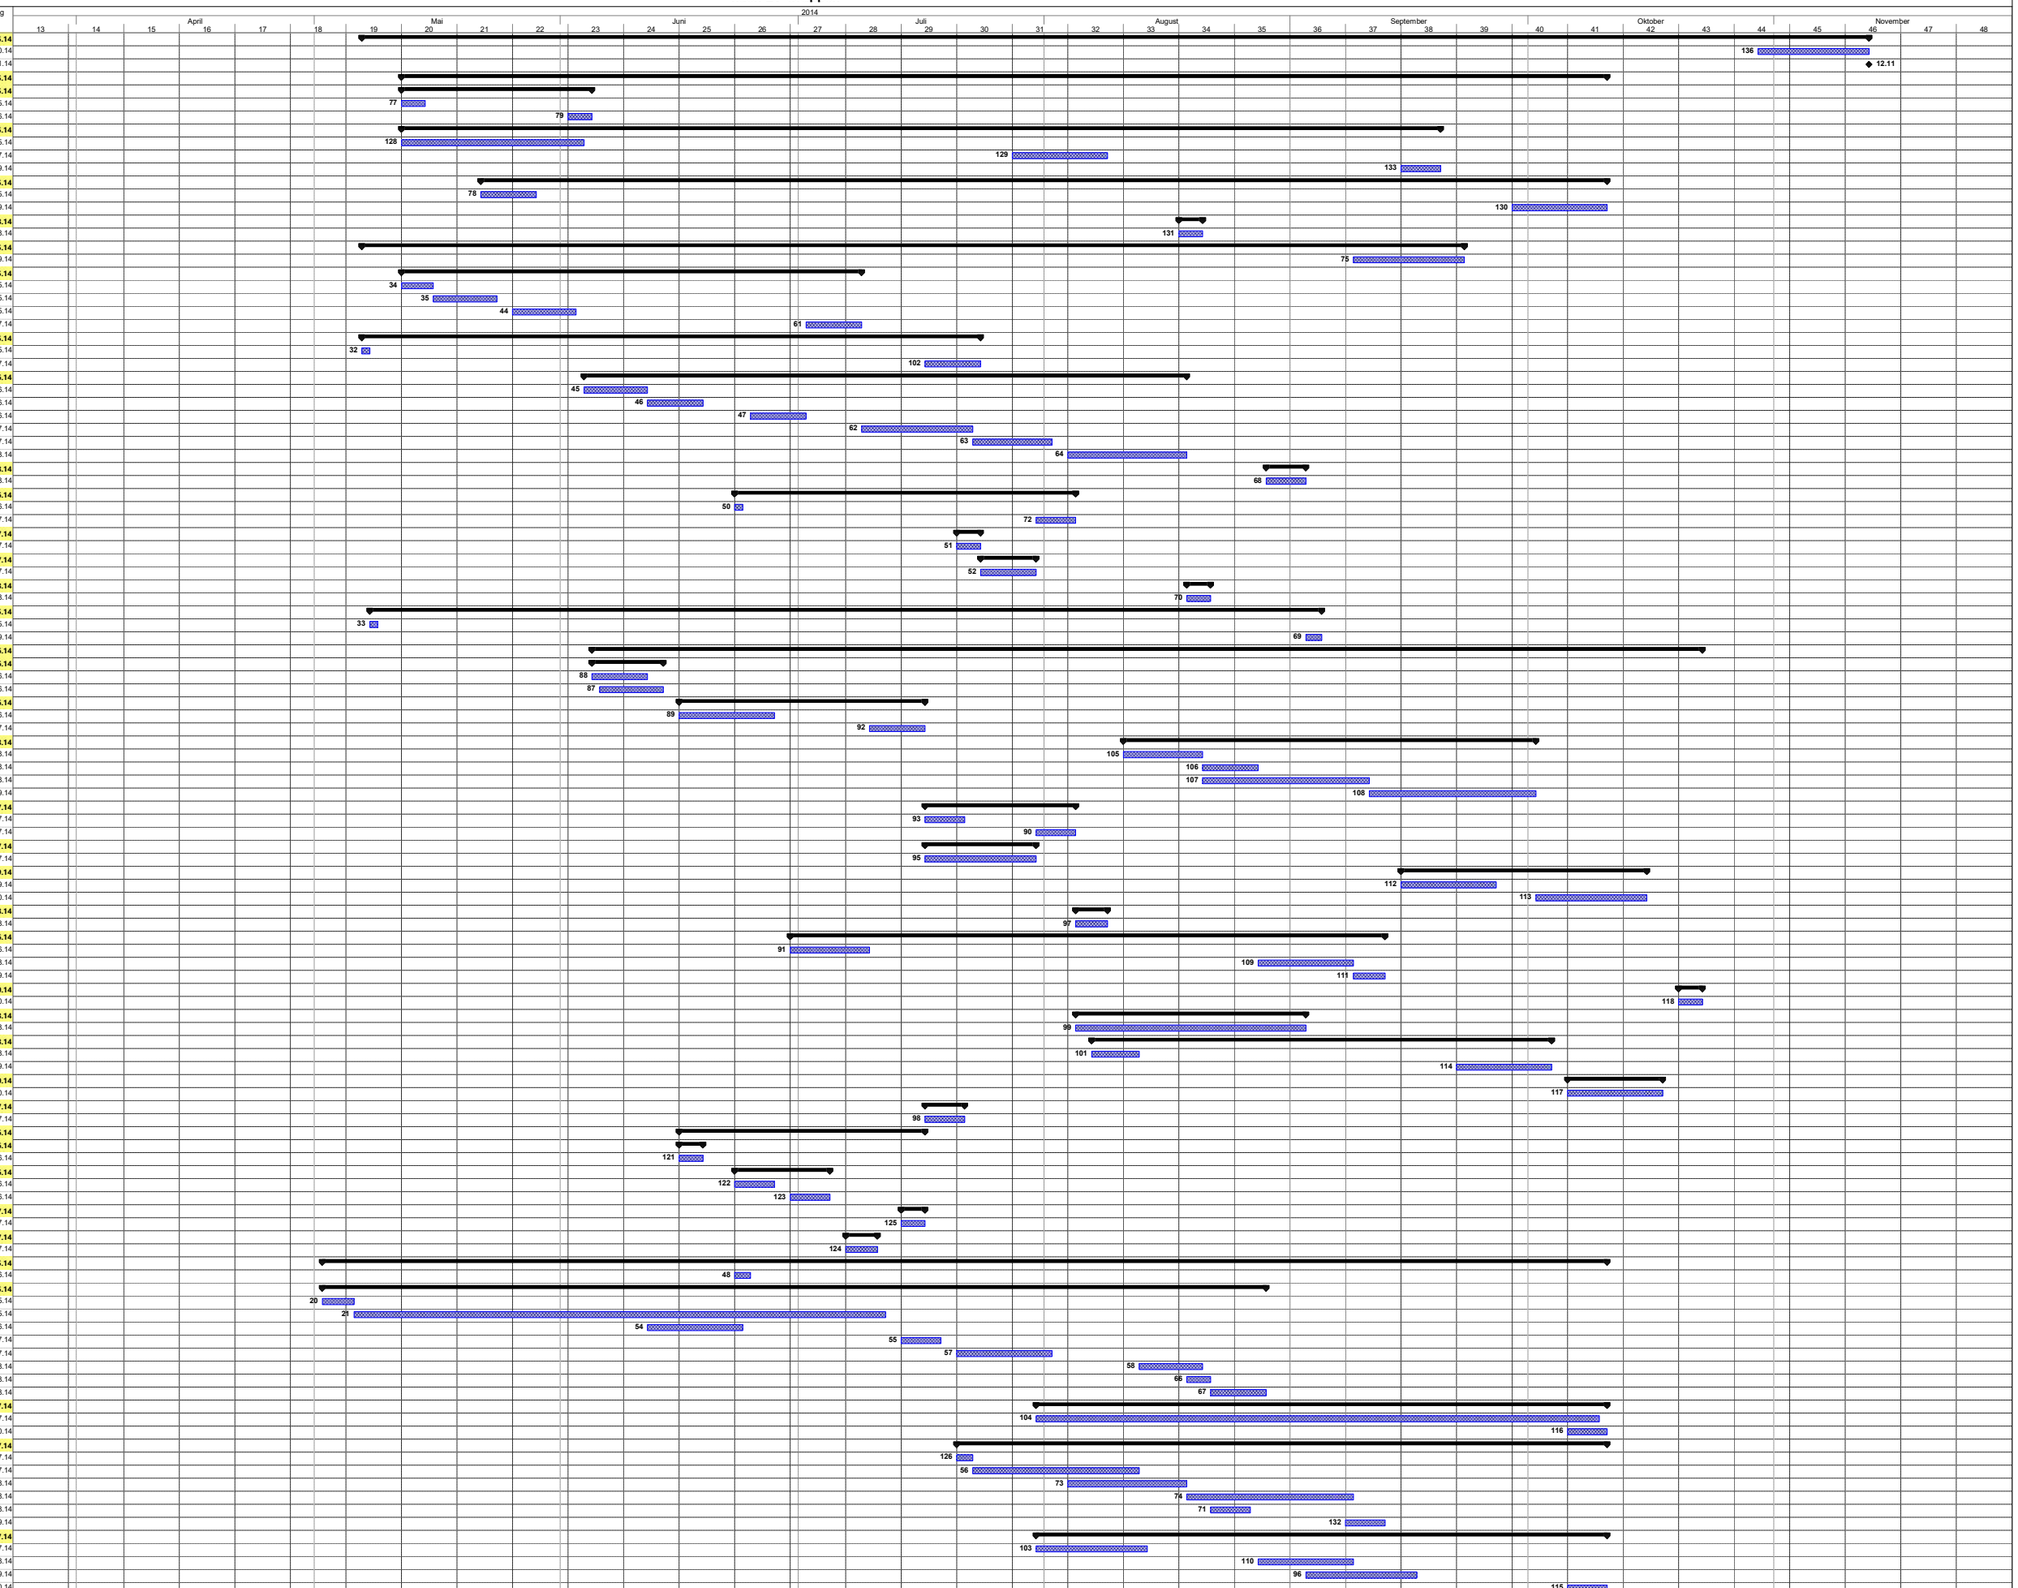

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | Externer Meilenstein | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Externe Vorgänge | In Arbeit
