ifcbridge-wbs
A_Detailterminplan

Nr.	GL.Nr.	VG Name	D	Frühester Anfang	Frühestes Ende
1	**1**	**PROJEKT Brücke BW533 Bergedo**	**60 t**	**10.11.24**	**31.01.25**
2	1.1	PLANUNGSPHASE	1 t	11.11.24	11.11.24
3	1.2	GENEHMIGUNGSPHASE	1 t	11.11.24	11.11.24
4	1.3	AUSSCHREIBUNGS-U.VERGAB	1 t	11.11.24	11.11.24
5	**1.4**	**AUSFÜHRUNGSPHASE**	**60 t**	**10.11.24**	**31.01.25**
6	1.4.1	MS Auftrag erteilt	0 t	10.11.24	10.11.24
7	1.4.2	MS Auftrag abgeschlossen	0 t	31.01.25	31.01.25
8	**1.4.3**	**VORBREITUNGSPHASE**	**57 t**	**11.11.24**	**29.01.25**
9	1.4.3.1	A_VB Baugelände freimac	3 t	11.11.24	13.11.24
10	1.4.3.2	A_VB Baustelle / BAB1 ein	5 t	14.11.24	20.11.24
11	**1.4.3.3**	**A_VB Erdarbeiten**	**5 t**	**14.11.24**	**20.11.24**
12	1.4.3.3.1	A_VB Aushub WL_OST	5 t	14.11.24	20.11.24
13	1.4.3.3.2	A_VB Aushub WL_WE	5 t	14.11.24	20.11.24
14	1.4.3.3.3	A_VB Aushub Mittelpfe	5 t	14.11.24	20.11.24
15	**1.4.3.4**	**Produktionsphase**	**49 t**	**20.11.24**	**29.01.25**
16	1.4.3.4.1	MS BST einrichten abg	0 t	20.11.24	20.11.24
17	1.4.3.4.2	MS Beginn BST räume	0 t	29.01.25	29.01.25
18	**1.4.4**	**HERSTELLUNGSPHASE**	**49 t**	**21.11.24**	**28.01.25**
19	1.4.4.1	MS Baubeginn	0 t	21.11.24	21.11.24
20	1.4.4.2	MS Beginn TW Montage	0 t	06.01.25	06.01.25
21	**1.4.4.3**	**OBJEKT B5 / BAB1**	**49 t**	**21.11.24**	**28.01.25**
22	1.4.4.3.1	MS Unterbau abgeschlo	0 t	07.01.25	07.01.25
23	1.4.4.3.2	MS Tragwerkherstellung	0 t	21.01.25	21.01.25
24	**1.4.4.3.3**	**A_HS UNTERBAU**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
25	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_OST**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
26	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_NO**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
27	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	1 t	21.11.24	21.11.24
28	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	10 t	22.11.24	05.12.24
29	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	5 t	06.12.24	12.12.24
30	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	15 t	13.12.24	02.01.25
31	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	1 t	13.12.24	13.12.24
32	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	1 t	13.12.24	13.12.24
33	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NC	3 t	03.01.25	07.01.25
34	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_SO**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
35	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	1 t	21.11.24	21.11.24
36	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	10 t	22.11.24	05.12.24
37	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	5 t	06.12.24	12.12.24
38	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	15 t	13.12.24	02.01.25
39	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	1 t	13.12.24	13.12.24
40	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	1 t	13.12.24	13.12.24
41	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	1 t	13.12.24	13.12.24
42	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SC	3 t	03.01.25	07.01.25
43	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_WEST**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
44	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_NW**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
45	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	1 t	21.11.24	21.11.24
46	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	10 t	22.11.24	05.12.24
47	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	5 t	06.12.24	12.12.24
48	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	15 t	13.12.24	02.01.25
49	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	1 t	13.12.24	13.12.24
50	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	1 t	13.12.24	13.12.24
51	1.4.4.3.3.	A_HS WL_NV	3 t	03.01.25	07.01.25
52	**1.4.4.3.3.**	**A_HS WL_SW**	**34 t**	**21.11.24**	**07.01.25**
53	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	1 t	21.11.24	21.11.24
54	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	10 t	22.11.24	05.12.24
55	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	5 t	27.12.24	02.01.25
56	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	15 t	06.12.24	26.12.24
57	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	1 t	03.01.25	03.01.25
58	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	1 t	03.01.25	03.01.25
59	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	3 t	03.01.25	07.01.25
60	1.4.4.3.3.	A_HS WL_SV	3 t	27.12.24	31.12.24
61	**1.4.4.3.3.**	**A_HS FU MITTELPI**	**33 t**	**21.11.24**	**06.01.25**
62	**1.4.4.3.3.**	**A_HS MPF_N**	**25 t**	**21.11.24**	**25.12.24**
63	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_N	5 t	21.11.24	27.11.24
64	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_N	5 t	28.11.24	04.12.24
65	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_N	5 t	05.12.24	11.12.24
66	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_N	10 t	12.12.24	25.12.24
67	**1.4.4.3.3.**	**A_HS MPF_S**	**25 t**	**21.11.24**	**25.12.24**
68	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_S	5 t	21.11.24	27.11.24
69	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_S	5 t	28.11.24	04.12.24
70	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_S	15 t	05.12.24	25.12.24
71	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_SE:S	5 t	26.12.24	01.01.25
72	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_W:S	3 t	02.01.25	06.01.25
73	1.4.4.3.3.	A_HS MPF_O:SE	3 t	02.01.25	06.01.25
74	**1.4.4.3.4**	**ÜBERBAU**	**33 t**	**13.12.24**	**28.01.25**
75	**1.4.4.3.4.**	**TRAGWERK**	**27 t**	**16.12.24**	**21.01.25**
76	**1.4.4.3.4.**	**FELD1 WL_SW**	**12 t**	**06.01.25**	**21.01.25**
77	1.4.4.3.4.	F1_Quertraeg	10 t	06.01.25	17.01.25
78	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
79	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
80	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
81	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
82	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
83	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
84	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
85	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
86	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
87	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
88	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
89	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
90	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
91	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
92	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
93	1.4.4.3.4.	F1_Stahltraeg	1 t	20.01.25	20.01.25
94	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
95	1.4.4.3.4.	F1_Kopfplatte	1 t	21.01.25	21.01.25
96	**1.4.4.3.4.**	**FELD2 WL_SO**	**12 t**	**16.12.24**	**31.12.24**
97	1.4.4.3.4.	F2_Quertraeg	10 t	16.12.24	27.12.24
98	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
99	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
100	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
101	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
102	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
103	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
104	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
105	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
106	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
107	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
108	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
109	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24

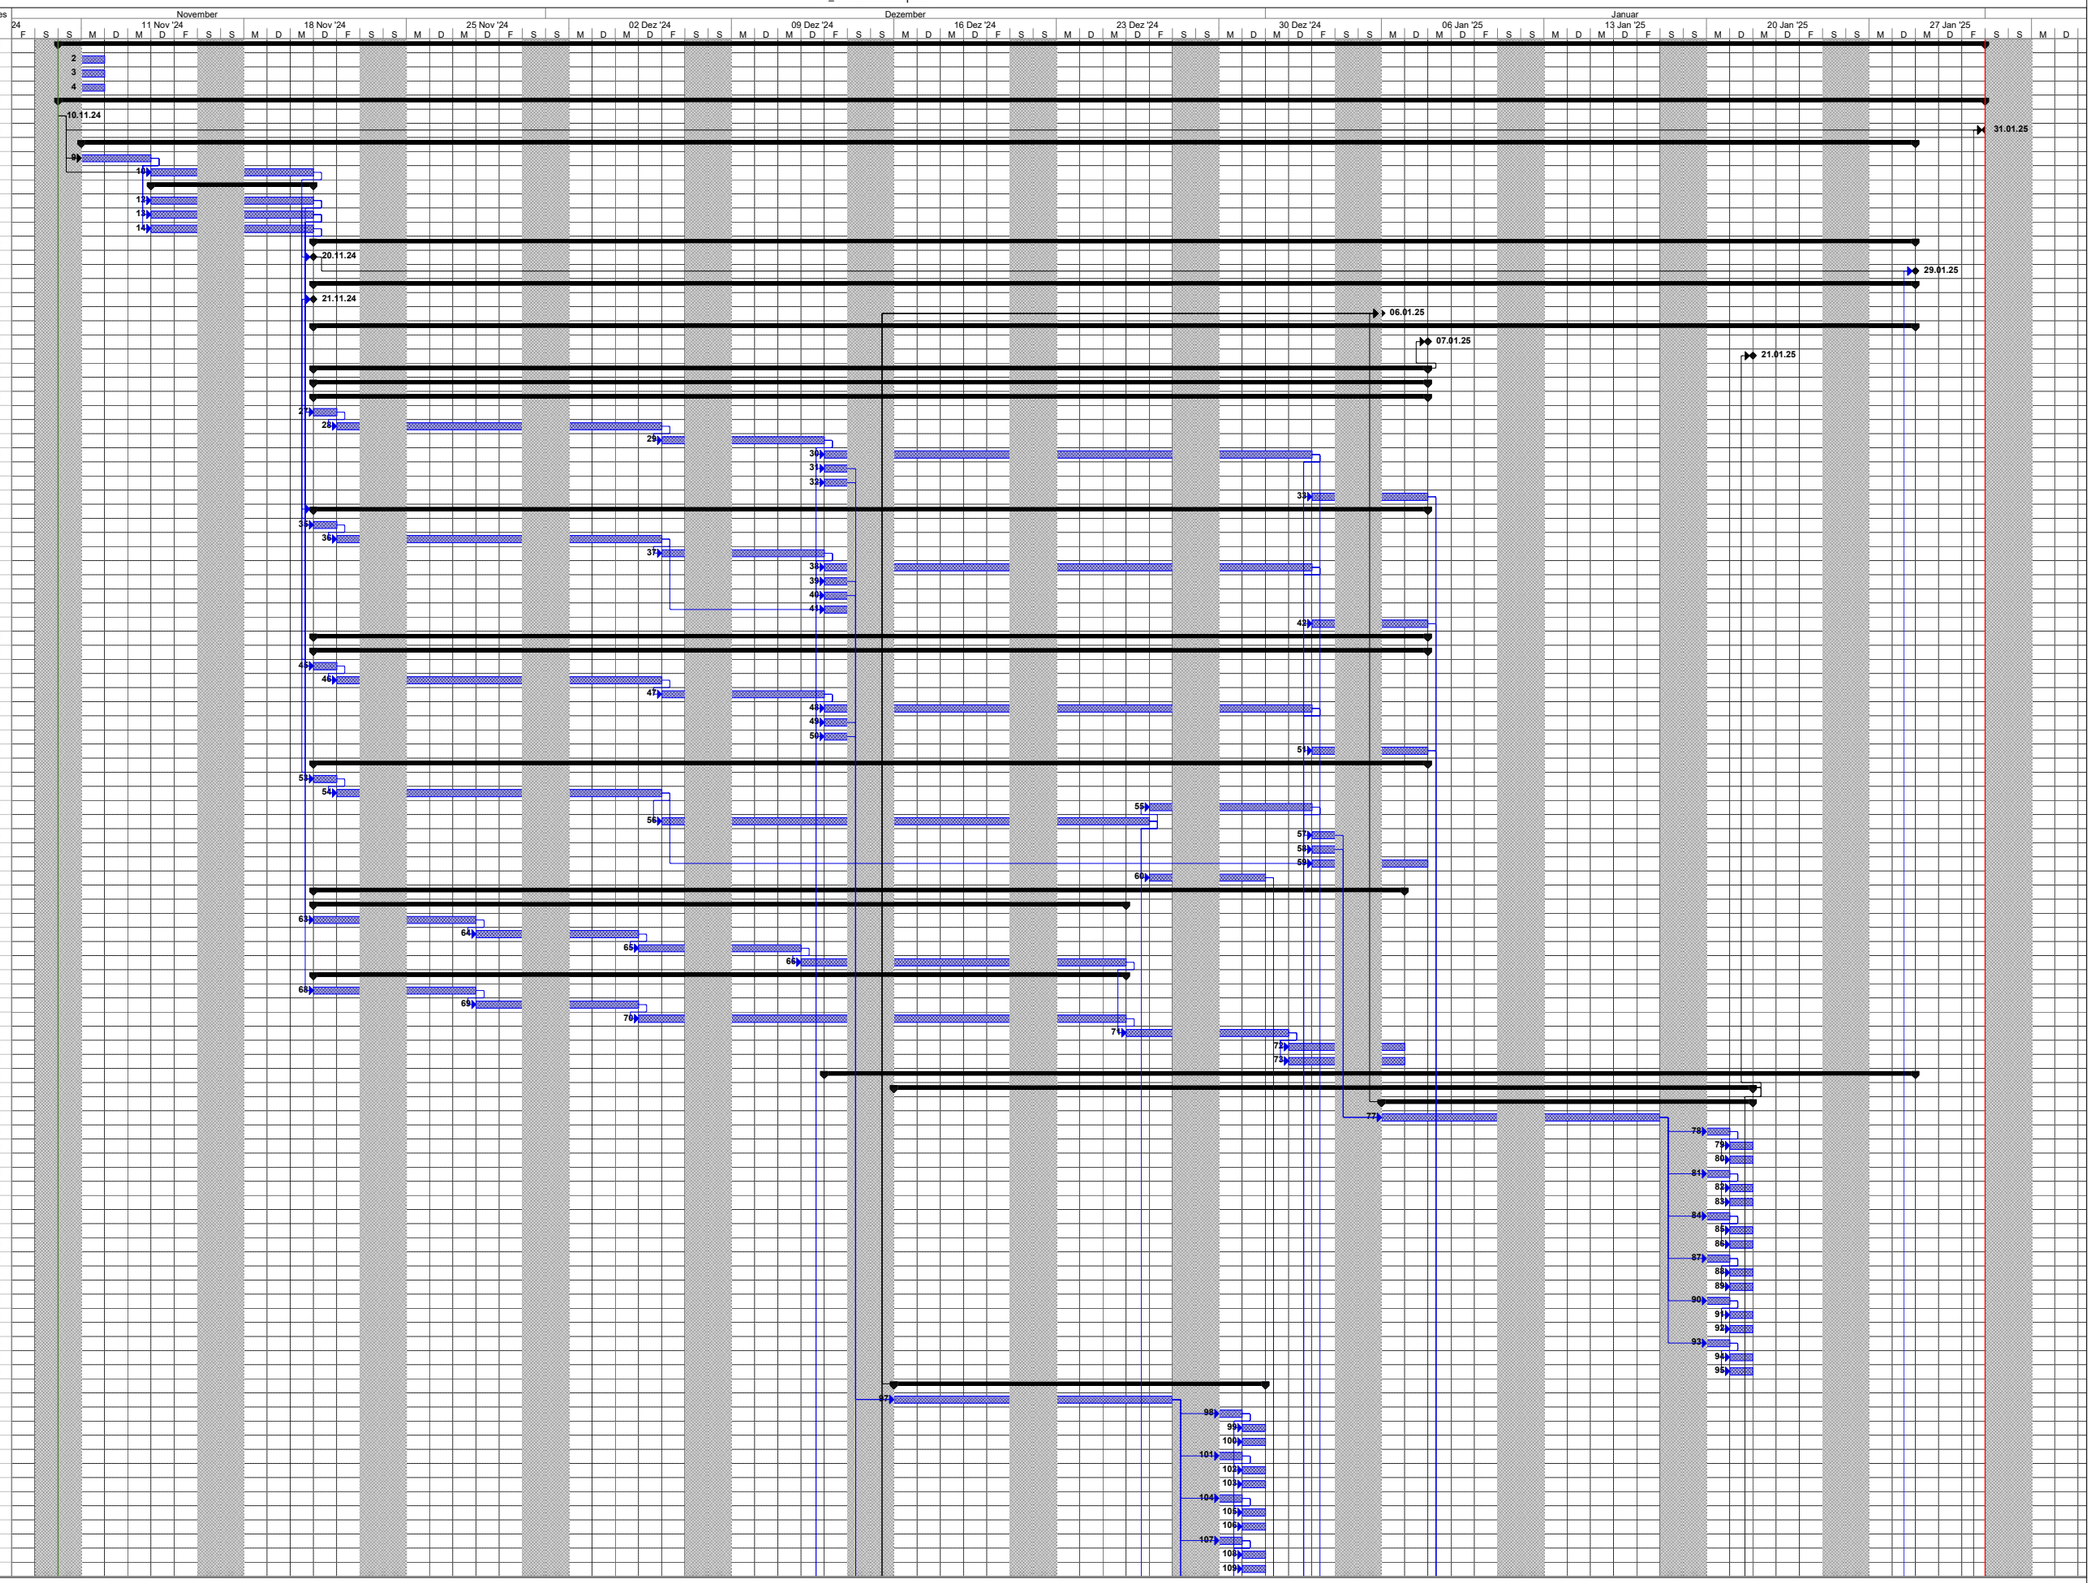

ifcbridge-wbs
A_Detailterminplan
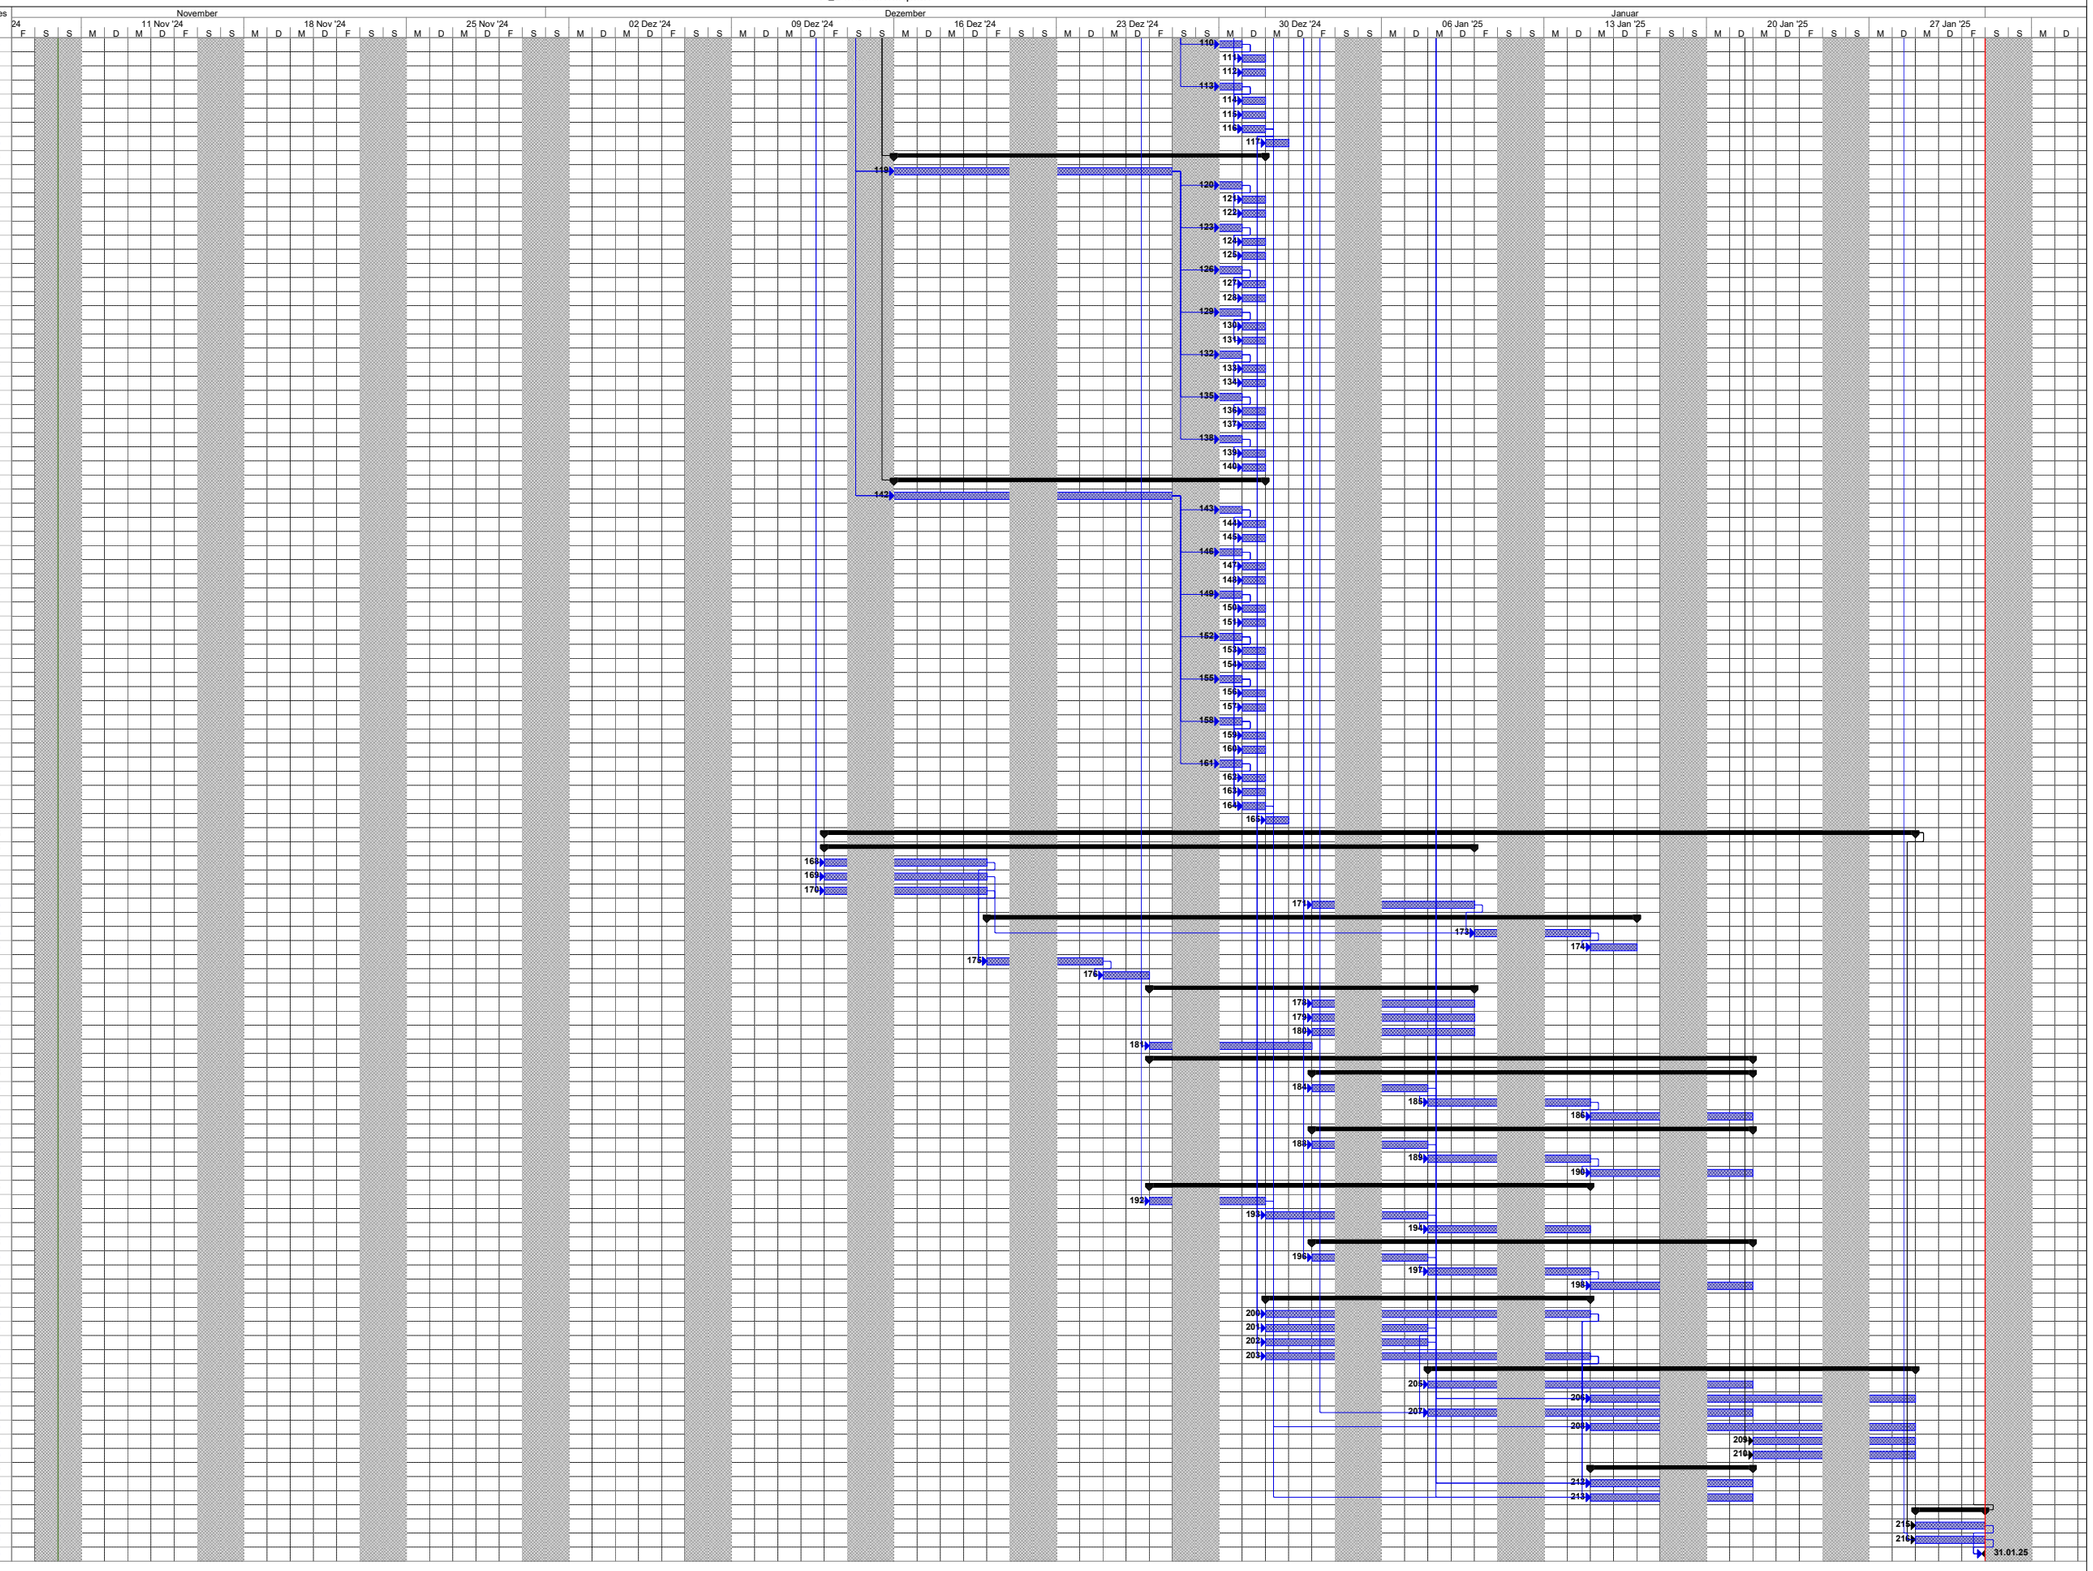
Nr.	GL.Nr.	VG Name	D	Frühester Anfang	Frühestes Ende
110	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
111	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
112	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
113	1.4.4.3.4.	F2_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
114	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
115	1.4.4.3.4.	F2_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
116	1.4.4.3.4.	UEB_S_FT:1102	1 t	31.12.24	31.12.24
117	1.4.4.3.4.	UEB_S_Ortbetor	1 t	01.01.25	01.01.25
118	**1.4.4.3.4.**	**FELD3 WL_NW**	**12 t**	**16.12.24**	**31.12.24**
119	1.4.4.3.4.	F3_Quertraeg	10 t	16.12.24	27.12.24
120	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
121	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
122	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
123	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
124	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
125	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
126	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
127	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
128	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
129	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
130	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
131	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
132	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
133	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
134	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
135	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
136	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
137	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
138	1.4.4.3.4.	F3_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
139	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
140	1.4.4.3.4.	F3_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
141	**1.4.4.3.4.**	**FELD4 WL_NO**	**12 t**	**16.12.24**	**31.12.24**
142	1.4.4.3.4.	F4_Quertraeg	10 t	16.12.24	27.12.24
143	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
144	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
145	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
146	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
147	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
148	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
149	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
150	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
151	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
152	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
153	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
154	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
155	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
156	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
157	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
158	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
159	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
160	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
161	1.4.4.3.4.	F4_Stahltraeg	1 t	30.12.24	30.12.24
162	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
163	1.4.4.3.4.	F4_Kopfplatte	1 t	31.12.24	31.12.24
164	1.4.4.3.4.	UEB_N_FT:1147	1 t	31.12.24	31.12.24
165	1.4.4.3.4.	UEB_N_Ortbetor	1 t	01.01.25	01.01.25
166	**1.4.4.3.4.**	**BRÜCKENAUSRÜS**	**33 t**	**13.12.24**	**28.01.25**
167	**1.4.4.3.4.**	**Fahrbahnübergi**	**20 t**	**13.12.24**	**09.01.25**
168	1.4.4.3.4.	F4_Fahrbahnü	5 t	13.12.24	19.12.24
169	1.4.4.3.4.	F2_Fahrbahnü	5 t	13.12.24	19.12.24
170	1.4.4.3.4.	F3_Fahrbahnü	5 t	13.12.24	19.12.24
171	1.4.4.3.4.	F1_Fahrbahnü	5 t	03.01.25	09.01.25
172	**1.4.4.3.4.**	**Strassenbelag**	**20 t**	**20.12.24**	**16.01.25**
173	1.4.4.3.4.	F1-2 Strasse_	3 t	10.01.25	14.01.25
174	1.4.4.3.4.	F1-2_Bodenm	2 t	15.01.25	16.01.25
175	1.4.4.3.4.	F3-4 Strasse_	3 t	20.12.24	24.12.24
176	1.4.4.3.4.	F3-4_Bodenm	2 t	25.12.24	26.12.24
177	**1.4.4.3.4.**	**Pflasterung**	**10 t**	**27.12.24**	**09.01.25**
178	1.4.4.3.4.	WL_NO_Pflas	5 t	03.01.25	09.01.25
179	1.4.4.3.4.	WL_SO_Pflas	5 t	03.01.25	09.01.25
180	1.4.4.3.4.	WL_NW:Pflas	5 t	03.01.25	09.01.25
181	1.4.4.3.4.	WL_SW:Pflas	5 t	27.12.24	02.01.25
182	**1.4.4.3.4.**	**Treppen**	**18 t**	**27.12.24**	**21.01.25**
183	**1.4.4.3.4.**	**Treppe WL-S**	**13 t**	**03.01.25**	**21.01.25**
184	1.4.4.3.4.	WL-SO Be	3 t	03.01.25	07.01.25
185	1.4.4.3.4.	WL-SO Bo	5 t	08.01.25	14.01.25
186	1.4.4.3.4.	WL-SO Tre	5 t	15.01.25	21.01.25
187	**1.4.4.3.4.**	**Treppe WL_N**	**13 t**	**03.01.25**	**21.01.25**
188	1.4.4.3.4.	WL_NO Be	3 t	03.01.25	07.01.25
189	1.4.4.3.4.	WL_NO Bo	5 t	08.01.25	14.01.25
190	1.4.4.3.4.	WL_NO Tr	5 t	15.01.25	21.01.25
191	**1.4.4.3.4.**	**Treppe WL_S**	**13 t**	**27.12.24**	**14.01.25**
192	1.4.4.3.4.	WL_SW B	3 t	27.12.24	31.12.24
193	1.4.4.3.4.	WL_SW B	5 t	01.01.25	07.01.25
194	1.4.4.3.4.	WL_SW S	5 t	08.01.25	14.01.25
195	**1.4.4.3.4.**	**Treppe WL_N**	**13 t**	**03.01.25**	**21.01.25**
196	1.4.4.3.4.	WL_NW B	3 t	03.01.25	07.01.25
197	1.4.4.3.4.	WL_NW B	5 t	08.01.25	14.01.25
198	1.4.4.3.4.	WL_NW S	5 t	15.01.25	21.01.25
199	**1.4.4.3.4.**	**Randbalken**	**10 t**	**01.01.25**	**14.01.25**
200	1.4.4.3.4.	Kappe_S_Uel	10 t	01.01.25	14.01.25
201	1.4.4.3.4.	Kappe_N_Uel	5 t	01.01.25	07.01.25
202	1.4.4.3.4.	Kappe_S_Uel	5 t	01.01.25	07.01.25
203	1.4.4.3.4.	Kappe_N_Uel	10 t	01.01.25	14.01.25
204	**1.4.4.3.4.**	**Geländer**	**15 t**	**08.01.25**	**28.01.25**
205	1.4.4.3.4.	Geländer_N:S	10 t	08.01.25	21.01.25
206	1.4.4.3.4.	Geländer_N:S	10 t	15.01.25	28.01.25
207	1.4.4.3.4.	Geländer_S:S	10 t	08.01.25	21.01.25
208	1.4.4.3.4.	Geländer_S:S	10 t	15.01.25	28.01.25
209	1.4.4.3.4.	Geländer_O:SE_	5 t	22.01.25	28.01.25
210	1.4.4.3.4.	Geländer_W:SE_	5 t	22.01.25	28.01.25
211	**1.4.4.3.4.**	**Anprallschutz**	**5 t**	**15.01.25**	**21.01.25**
212	1.4.4.3.4.	Geländer_N:S	5 t	15.01.25	21.01.25
213	1.4.4.3.4.	Geländer_S:S	5 t	15.01.25	21.01.25
214	**1.4.5**	**NACHLAUFPHASE**	**3 t**	**29.01.25**	**31.01.25**
215	1.4.5.1	Mängelbehebung	3 t	29.01.25	31.01.25
216	1.4.5.2	Baustelle räumen	3 t	29.01.25	31.01.25
217	1.4.5.3	MS Abnahme / Übergabe	0 t	31.01.25	31.01.25
